ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Opstart	1 day	Mon 31-08-20	Mon 31-08-20
2	**Stenløse SydØst**	**152 days**	**Tue 01-09-20**	**Mon 19-04-21**
3	**Engholmvej**	**106 days**	**Tue 01-09-20**	**Tue 09-02-21**
4	**Etape 1 Byvej - 160m**	**11 days**	**Tue 01-09-20**	**Tue 15-09-20**
5	Opgravning	4 days	Tue 01-09-20	Fri 04-09-20
6	Smedarbejde	4 days	Mon 07-09-20	Thu 10-09-20
7	Opdækning	2 days	Fri 11-09-20	Mon 14-09-20
8	Asfalt Etape 1	1 day	Tue 15-09-20	Tue 15-09-20
9	**Etape 2.1 Engholmvej - 180m - 7 stik**	**21 days**	**Mon 21-09-20**	**Mon 19-10-20**
10	Opgravning	11 days	Mon 21-09-20	Mon 05-10-20
11	Smedarbejde	11 days	Mon 28-09-20	Mon 12-10-20
12	Opdækning	11 days	Mon 05-10-20	Mon 19-10-20
13	**Etape 2.2 Engholmvej - 260m - 0 stk**	**16 days**	**Tue 20-10-20**	**Tue 10-11-20**
14	Opgravning	6 days	Tue 20-10-20	Tue 27-10-20
15	Smedarbejde	6 days	Tue 27-10-20	Tue 03-11-20
16	Opdækning	6 days	Tue 03-11-20	Tue 10-11-20
17	**Etape 2.3 Degnebakken - 250m - 0 stik**	**20 days**	**Wed 28-10-20**	**Tue 24-11-20**
18	Opgravning	8 days	Wed 28-10-20	Fri 06-11-20
19	Smedarbejde	8 days	Wed 04-11-20	Fri 13-11-20
20	Opdækning	8 days	Wed 11-11-20	Fri 20-11-20
21	Asfalt Etape 2.1, 2.2 og 2.3	2 days	Mon 23-11-20	Tue 24-11-20
22	**Etape 3 Rugvænget - 245m - 9 stik**	**25 days**	**Mon 09-11-20**	**Fri 11-12-20**
23	Opgravning	15 days	Mon 09-11-20	Fri 27-11-20
24	Smedarbejde	15 days	Mon 16-11-20	Fri 04-12-20
25	Opdækning	15 days	Mon 23-11-20	Fri 11-12-20
26	**Etape 4 Hvedevænget - 250m - 10 stik**	**28 days**	**Mon 30-11-20**	**Wed 20-01-21**
27	Opgravning	15 days	Mon 30-11-20	Fri 18-12-20
28	Smedarbejde	15 days	Mon 07-12-20	Fri 08-01-21
29	Opdækning	15 days	Mon 14-12-20	Fri 15-01-21
30	Asfalt Etape 3 og 4	3 days	Mon 18-01-21	Wed 20-01-21
31	**Etape 5 Havrevængetvænget - 383m - 9 stik**	**27 days**	**Mon 04-01-21**	**Tue 09-02-21**
32	Opgravning	17 days	Mon 04-01-21	Tue 26-01-21
33	Smedarbejde	17 days	Mon 11-01-21	Tue 02-02-21
34	Opdækning	17 days	Mon 18-01-21	Tue 09-02-21
35	**Kornvænget**	**56 days**	**Wed 27-01-21**	**Mon 19-04-21**
36	**Etape 6 Byvej - 280m - 2 stik**	**20 days**	**Wed 27-01-21**	**Tue 23-02-21**
37	Opgravning	8 days	Wed 27-01-21	Fri 05-02-21
38	Smedarbejde	8 days	Wed 03-02-21	Fri 12-02-21
39	Opdækning	8 days	Wed 10-02-21	Fri 19-02-21
40	Asfalt Etape 5 og 6	2 days	Mon 22-02-21	Tue 23-02-21
41	**Etape 7 Kornvænget - 550 - 5 stik**	**26 days**	**Mon 08-02-21**	**Mon 15-03-21**
42	Opgravning	16 days	Mon 08-02-21	Mon 01-03-21
43	Smedarbejde	16 days	Mon 15-02-21	Mon 08-03-21
44	Opdækning	16 days	Mon 22-02-21	Mon 15-03-21
45	**Etape 8 Markvej - 80m - 2 stik**	**10 days**	**Tue 16-03-21**	**Mon 29-03-21**
46	Opgravning	4 days	Tue 16-03-21	Fri 19-03-21
47	Smedarbejde	4 days	Mon 22-03-21	Thu 25-03-21
48	Opdækning	2 days	Fri 26-03-21	Mon 29-03-21
49	**Etape 9 Bygvænget nord - 60m - 2 stik**	**10 days**	**Tue 02-03-21**	**Mon 15-03-21**
50	Opgravning	4 days	Tue 02-03-21	Fri 05-03-21
51	Smedarbejde	4 days	Mon 08-03-21	Thu 11-03-21
52	Opdækning	2 days	Fri 12-03-21	Mon 15-03-21
53	**Etape 10 Bygvænget syd - 230m - 1 stik**	**16 days**	**Mon 22-03-21**	**Thu 15-04-21**
54	Opgravning	6 days	Mon 22-03-21	Mon 29-03-21
55	Smedarbejde	6 days	Mon 29-03-21	Thu 08-04-21
56	Opdækning	6 days	Thu 08-04-21	Thu 15-04-21
57	Asfalt 7-10	2 days	Fri 16-04-21	Mon 19-04-21
58	**Stenløse NordØst Under udarbejdelse**	**167 days**	**Mon 19-10-20**	**Thu 01-07-21**
59	**Stenlillevej**	**83 days**	**Mon 19-10-20**	**Wed 24-02-21**
60	**Etape 11 Frederikssundsvej - 90m**	**28 days**	**Mon 19-10-20**	**Wed 25-11-20**
61	Opgravning	4 days	Mon 19-10-20	Thu 22-10-20
62	Smedarbejde	3 days	Fri 23-10-20	Tue 27-10-20
63	Opdækning	3 days	Wed 28-10-20	Fri 30-10-20
64	Asfalt Etape 11	3 days	Mon 23-11-20	Wed 25-11-20
65	**Etape 12 Stenlillevej - 590m - 3 stik**	**25 days**	**Mon 02-11-20**	**Fri 04-12-20**
66	Opgravning	15 days	Mon 02-11-20	Fri 20-11-20
67	Smedarbejde	15 days	Mon 09-11-20	Fri 27-11-20
68	Opdækning	15 days	Mon 16-11-20	Fri 04-12-20
69	**Etape 13 Stenlille Div.sideveje - 820m - 17 stik**	**58 days**	**Mon 23-11-20**	**Wed 24-02-21**
70	Opgravning	34 days	Mon 23-11-20	Thu 21-01-21
71	Smedarbejde	34 days	Mon 30-11-20	Thu 28-01-21
72	Opdækning	34 days	Mon 07-12-20	Thu 04-02-21
73	Asfalt Etape 12+13	3 days	Mon 22-02-21	Wed 24-02-21
74	**Søsumvej/Rosenvænget**	**106 days**	**Fri 22-01-21**	**Tue 29-06-21**
75	**Etape 14 Rosenvænget mm. - 1045m - 18 stik**	**49 days**	**Fri 16-04-21**	**Tue 29-06-21**
76	Opgravning	39 days	Fri 16-04-21	Tue 15-06-21
77	Smedarbejde	39 days	Fri 23-04-21	Tue 22-06-21
78	Opdækning	39 days	Mon 03-05-21	Tue 29-06-21
79	**Etape 15 Højdevej - 290m - 4 stik**	**20 days**	**Fri 22-01-21**	**Thu 18-02-21**
80	Opgravning	10 days	Fri 22-01-21	Thu 04-02-21
81	Smedarbejde	10 days	Fri 29-01-21	Thu 11-02-21
82	Opdækning	10 days	Fri 05-02-21	Thu 18-02-21
83	**Etape 16 Søsumvej - 255m - 2 stik**	**20 days**	**Fri 05-02-21**	**Thu 04-03-21**
84	Opgravning	8 days	Fri 05-02-21	Tue 16-02-21
85	Smedarbejde	8 days	Fri 12-02-21	Tue 23-02-21
86	Opdækning	8 days	Fri 19-02-21	Tue 02-03-21
87	Asfalt Etape 15-16	2 days	Wed 03-03-21	Thu 04-03-21
88	**Etape 17 Møleengen mm. - 775m - 7 stik**	**33 days**	**Fri 05-03-21**	**Fri 23-04-21**
89	Opgravning	23 days	Fri 05-03-21	Fri 09-04-21
90	Smedarbejde	23 days	Fri 12-03-21	Fri 16-04-21
91	Opdækning	23 days	Fri 19-03-21	Fri 23-04-21
92	**Etape 18 Skolevej - 240m - 3 stik**	**21 days**	**Mon 12-04-21**	**Tue 11-05-21**
93	Opgravning	8 days	Mon 12-04-21	Wed 21-04-21
94	Smedarbejde	8 days	Mon 19-04-21	Wed 28-04-21
95	Opdækning	8 days	Thu 29-04-21	Tue 11-05-21
96	**Etape 19 Fuglesøvej - 120m - 2 stik**	**15 days**	**Wed 12-05-21**	**Fri 04-06-21**
97	Opgravning	5 days	Wed 12-05-21	Thu 20-05-21
98	Smedarbejde	5 days	Fri 21-05-21	Fri 28-05-21
99	Opdækning	5 days	Mon 31-05-21	Fri 04-06-21
100	Asfalt Resterende	2 days	Wed 30-06-21	Thu 01-07-21

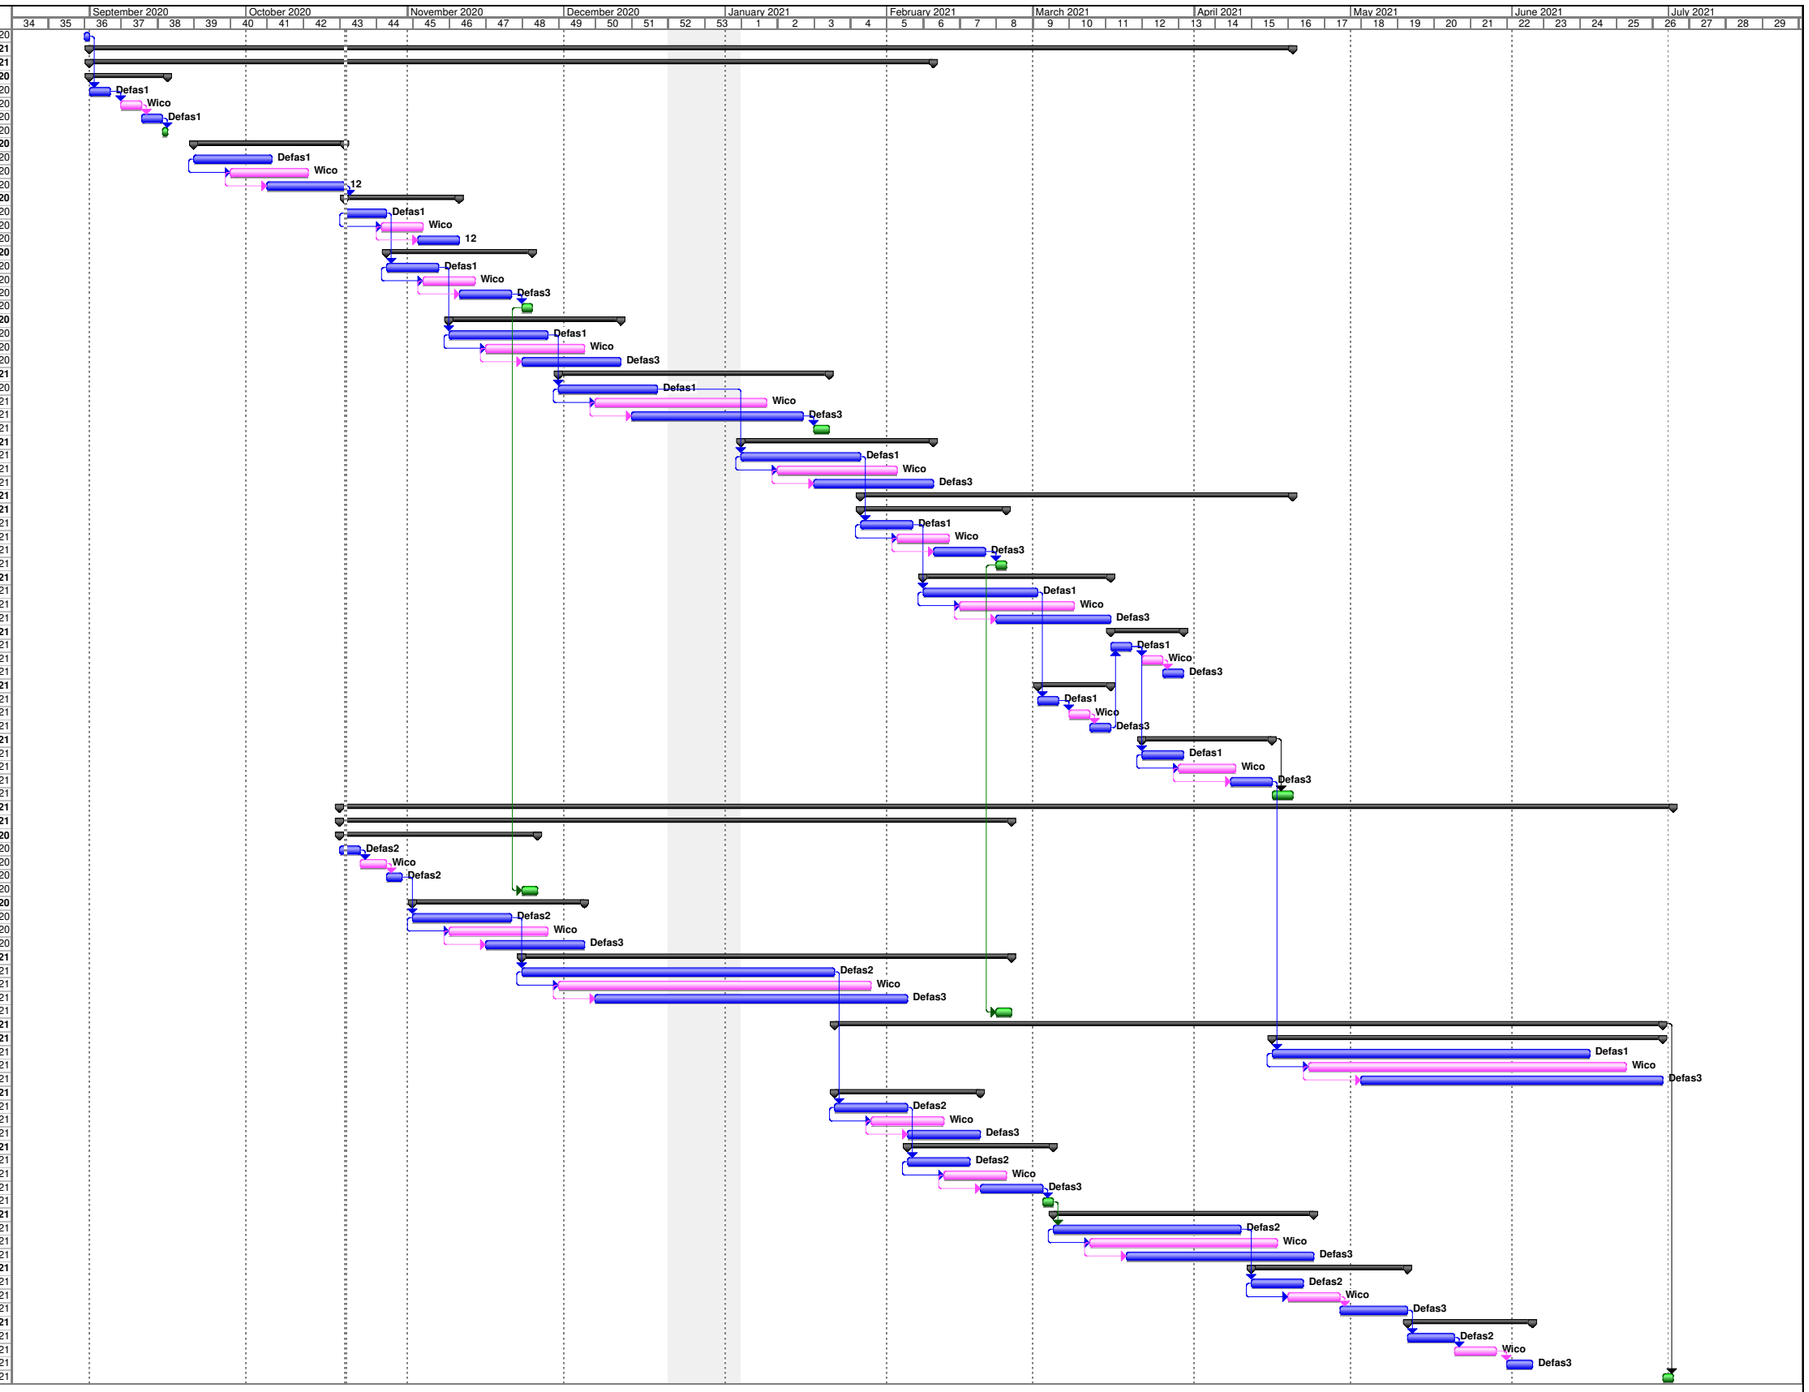

Rivision: D
Date: Tue 20-10-20

Task | Split | Progress | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Deadline
